


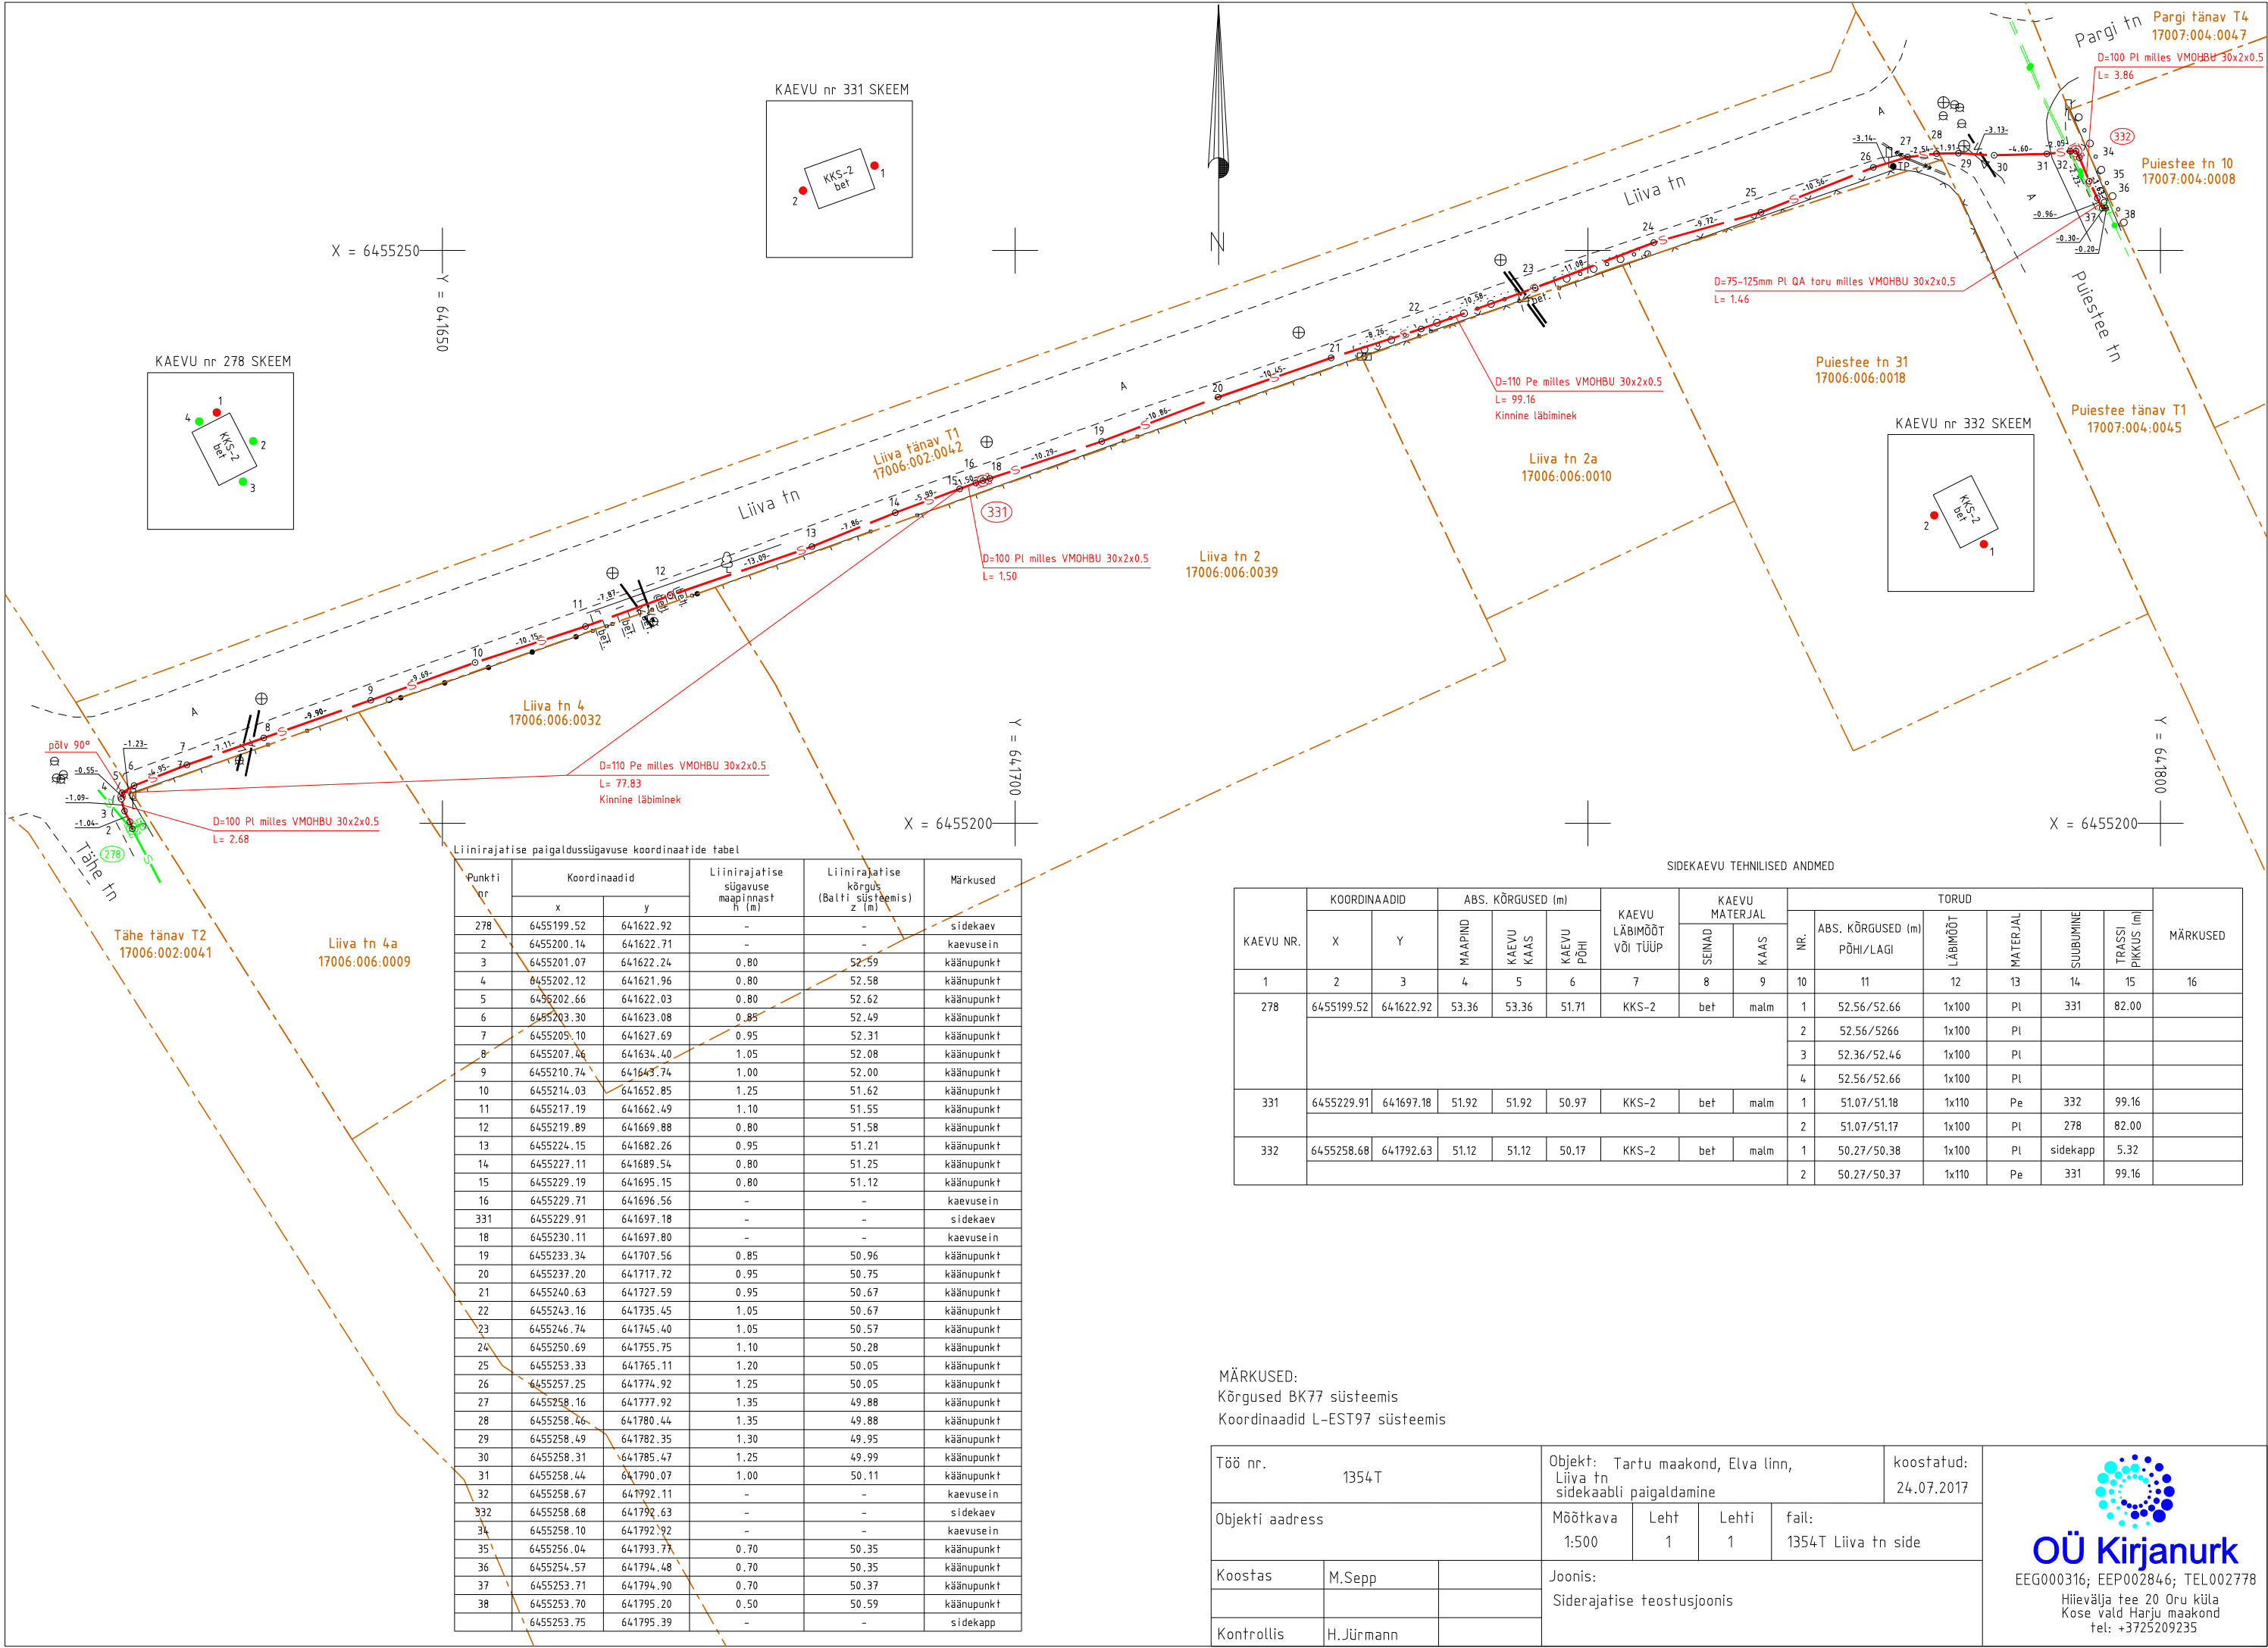

Liinirajatise paigaldussügavuse koordinaatide tabel					
Punkti nr	Koordinaadid		Liinirajatise sügavuse maapinnast h (m)	Liinirajatise kõrgus (Balti süsteemis) z (m)	Märkused
	x	y			
278	6455199.52	641622.92	-	-	sidekaev
2	6455200.14	641622.71	-	-	kaevusein
3	6455201.07	641622.24	0.80	52.59	käänupunkt
4	6455202.12	641621.96	0.80	52.58	käänupunkt
5	6455202.66	641622.03	0.80	52.62	käänupunkt
6	6455203.30	641623.08	0.85	52.49	käänupunkt
7	6455205.10	641627.69	0.95	52.31	käänupunkt
8	6455207.46	641634.40	1.05	52.08	käänupunkt
9	6455210.74	641643.74	1.00	52.00	käänupunkt
10	6455214.03	641652.85	1.25	51.62	käänupunkt
11	6455217.19	641662.49	1.10	51.55	käänupunkt
12	6455219.89	641669.88	0.80	51.58	käänupunkt
13	6455224.15	641682.26	0.95	51.21	käänupunkt
14	6455227.11	641689.54	0.80	51.25	käänupunkt
15	6455229.19	641695.15	0.80	51.12	käänupunkt
16	6455229.71	641696.56	-	-	kaevusein
331	6455229.91	641697.18	-	-	sidekaev
18	6455230.11	641697.80	-	-	kaevusein
19	6455233.34	641707.56	0.85	50.96	käänupunkt
20	6455237.20	641717.72	0.95	50.75	käänupunkt
21	6455240.63	641727.59	0.95	50.67	käänupunkt
22	6455243.16	641735.45	1.05	50.67	käänupunkt
23	6455246.74	641745.40	1.05	50.57	käänupunkt
24	6455250.69	641755.75	1.10	50.28	käänupunkt
25	6455253.33	641765.11	1.20	50.05	käänupunkt
26	6455257.25	641774.92	1.25	50.05	käänupunkt
27	6455258.16	641777.92	1.35	49.88	käänupunkt
28	6455258.46	641780.44	1.35	49.88	käänupunkt
29	6455258.49	641782.35	1.30	49.95	käänupunkt
30	6455258.31	641785.47	1.25	49.99	käänupunkt
31	6455258.44	641790.07	1.00	50.11	käänupunkt
32	6455258.67	641792.11	-	-	kaevusein
332	6455258.68	641792.63	-	-	sidekaev
34	6455258.10	641792.92	-	-	kaevusein
35	6455256.04	641793.77	0.70	50.35	käänupunkt
36	6455254.57	641794.48	0.70	50.35	käänupunkt
37	6455253.71	641794.90	0.70	50.37	käänupunkt
38	6455253.70	641795.20	0.50	50.59	käänupunkt
	6455253.75	641795.39	-	-	sidekapp

SIDEKAEVU TEHNILISED ANDMED															
KAEVU NR.	KOORDINAADID		ABS. KÕRGUSED (m)			KAEVU LÄBIMÕÖT VÕI TÜÜP	KAEVU MATERJAL		TORUD						MÄRKUSED
	X	Y	MAAPIND	KAEVU KAAS	KAEVU PÕHI		SEINAD	KAAS	NR.	ABS. KÕRGUSED (m) PÕHI/LAGI	LÄBIMÕÖT	MATERJAL	SUUBUMINE	TRASSI PIKKUS (m)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
278	6455199.52	641622.92	53.36	53.36	51.71	KKS-2	bet	malm	1	52.56/52.66	1x100	Pl	331	82.00	
									2	52.56/52.66	1x100	Pl			
									3	52.36/52.46	1x100	Pl			
									4	52.56/52.66	1x100	Pl			
331	6455229.91	641697.18	51.92	51.92	50.97	KKS-2	bet	malm	1	51.07/51.18	1x110	Pe	332	99.16	
									2	51.07/51.17	1x100	Pl	278	82.00	
332	6455258.68	641792.63	51.12	51.12	50.17	KKS-2	bet	malm	1	50.27/50.38	1x100	Pl	sidekapp	5.32	
									2	50.27/50.37	1x110	Pe	331	99.16	

MÄRKUSED:
Kõrgused BK77 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Töö nr.			1354T			Objekt: Tartu maakond, Elva linn, Liiva tn sidekaabli paigaldamine			koostatud: 24.07.2017			 OÜ Kirjanurk EEG000316; EEP002846; TEL002778 Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harju maakond tel: +3725209235		
Objekti aadress					Möötkava 1:500		Leht 1	Lehti 1	fail: 1354T Liiva tn side					
Koostas		M.Sepp				Joonis:								
						Siderajatise teostusjoonis								
Kontrollis		H.Jürmann												
