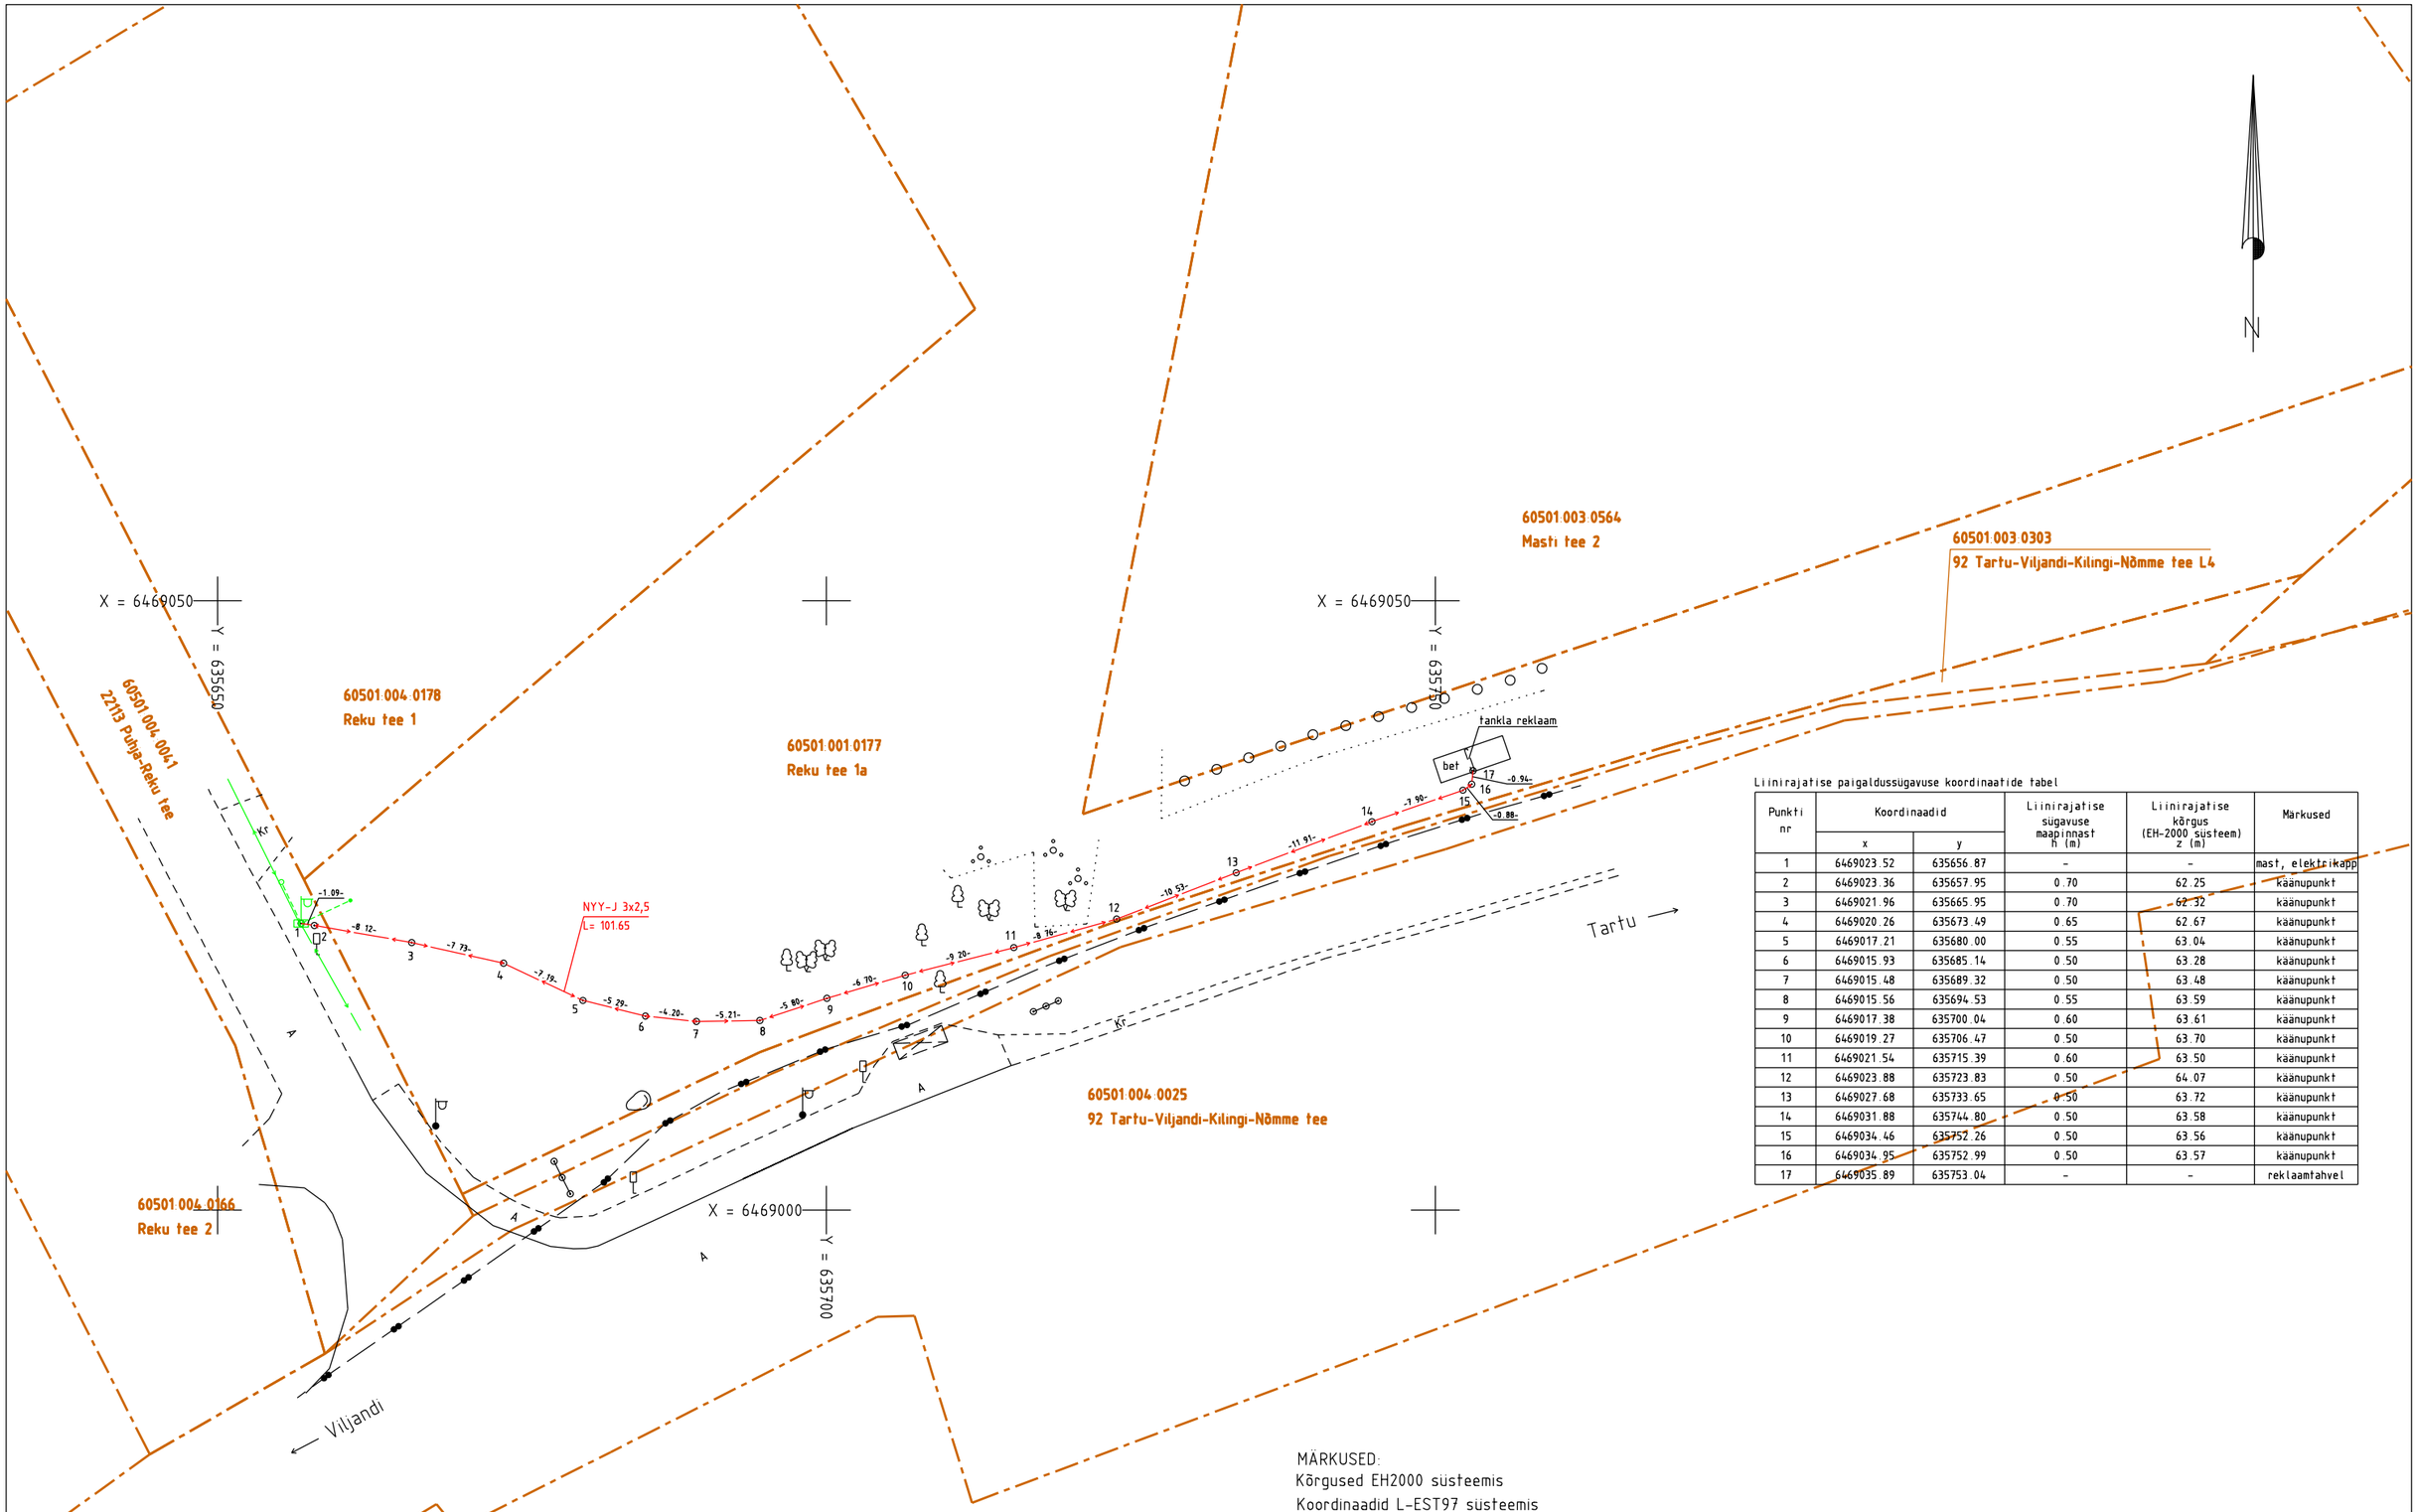

Liinirajatise paigaldussügavuse koordinaatide tabel

Punkti nr	Koordinaadid x	Koordinaadid y	Liinirajatise sügavuse maapinnast h (m)	Liinirajatise kõrgus (EH-2000 süsteem) z (m)	Märkused
1	6469023.52	635656.87	-	-	mast, elektrikapp
2	6469023.36	635657.95	0.70	62.25	käänupunkt
3	6469021.96	635665.95	0.70	62.32	käänupunkt
4	6469020.26	635673.49	0.65	62.67	käänupunkt
5	6469017.21	635680.00	0.55	63.04	käänupunkt
6	6469015.93	635685.14	0.50	63.28	käänupunkt
7	6469015.48	635689.32	0.50	63.48	käänupunkt
8	6469015.56	635694.53	0.55	63.59	käänupunkt
9	6469017.38	635700.04	0.60	63.61	käänupunkt
10	6469019.27	635706.47	0.50	63.70	käänupunkt
11	6469021.54	635715.39	0.60	63.50	käänupunkt
12	6469023.88	635723.83	0.50	64.07	käänupunkt
13	6469027.68	635733.65	0.50	63.72	käänupunkt
14	6469031.88	635744.80	0.50	63.58	käänupunkt
15	6469034.46	635752.26	0.50	63.56	käänupunkt
16	6469034.95	635752.99	0.50	63.57	käänupunkt
17	6469035.89	635753.04	-	-	reklaamtahvel

MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Töö nr. 1949T			Objekt: Tartu maakond, Elva vald, Puhja alevik. Puhja tankla reklaami toitekaabel			koostatud: 27.06.2018
Objekti aadress			Mõõtkava 1:500	Leht 1	Lehti 1	fail: 1949T tankla rekl kaabel
Koostas	M.Sepp		Joonis: Elektrirajatise teostusjoonis			
Kontrollis	H.Jürmann					

OÜ Kirjanurk
EEG000316; EEP002846; TEL002778
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +3725209235
