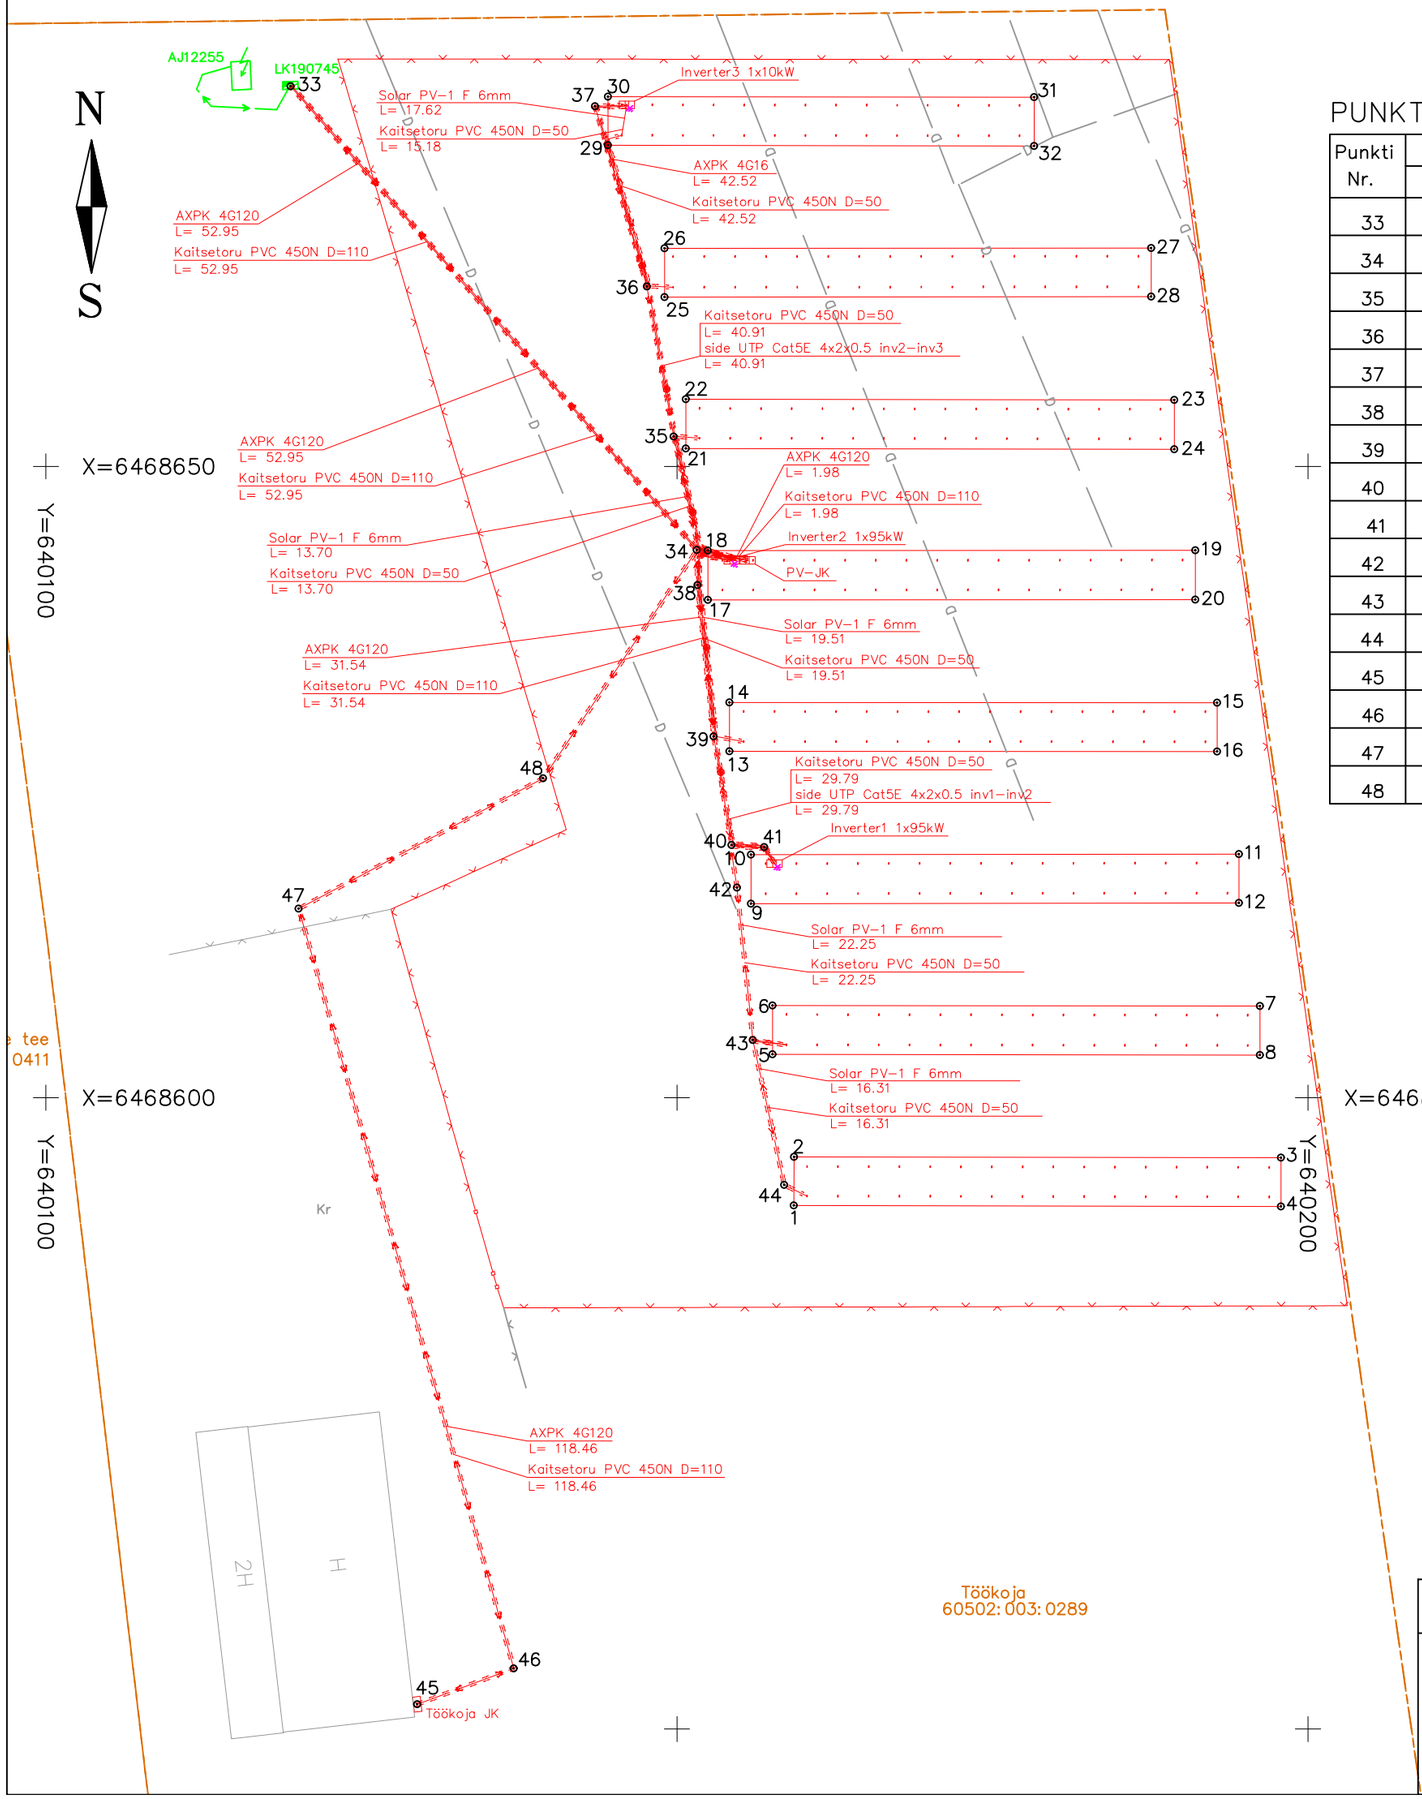

PUNKTIDE TABEL

Punkti Nr.	Koordinaadid			
	X	Y	Z	Abs.kõrgus
33	6468680.09	640119.38	60.86	60.16
34	6468643.36	640151.57	59.98	59.28
35	6468652.37	640149.74	59.81	59.11
36	6468664.24	640147.62	59.54	58.84
37	6468678.52	640143.51	59.28	58.58
38	6468640.60	640151.62	60.08	59.38
39	6468628.60	640152.91	60.53	59.83
40	6468620.01	640154.33	60.93	60.23
41	6468619.85	640156.91	60.82	60.12
42	6468616.63	640154.76	61.11	60.41
43	6468604.56	640156.01	61.77	61.07
44	6468593.09	640158.51	62.07	61.37
45	6468551.96	640129.42	61.12	60.42
46	6468554.80	640137.07	61.15	60.45
47	6468614.96	640120.03	60.75	60.05
48	6468625.29	640139.39	61.41	60.71

PUNKTIDE TABEL

Punkti Nr.	Koordinaadid	
	X	Y
1	6468591.46	640159.26
2	6468595.31	640159.27
3	6468595.25	640197.86
4	6468591.39	640197.85
5	6468603.43	640157.57
6	6468607.31	640157.57
7	6468607.25	640196.20
8	6468603.38	640196.19
9	6468615.37	640155.87
10	6468619.25	640155.87
11	6468619.30	640194.52
12	6468615.41	640194.53
13	6468627.43	640154.15
14	6468631.30	640154.15
15	6468631.28	640192.79
16	6468627.41	640192.79
17	6468639.41	640152.45
18	6468643.33	640152.45
19	6468643.36	640191.08
20	6468639.44	640191.08
21	6468651.41	640150.70
22	6468655.32	640150.70
23	6468655.26	640189.41
24	6468651.35	640189.40
25	6468663.40	640149.02
26	6468667.26	640149.02
27	6468667.29	640187.57
28	6468663.44	640187.57
29	6468675.42	640144.53
30	6468679.27	640144.54
31	6468679.23	640178.30
32	6468675.38	640178.30

MÄRKUSED:
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis.
Kõrgused EH2000 süsteemis.
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 08.09.2022 (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

Objekti nimetus	**Töökoja, Kaimi küla, Elva vald, Tartu maakond**				Tellija/Ehitaja	SMARTECON OÜ	
Merilo Grupp OÜ	Joonis	Elektripaigaldise teostusjoonis			Joonise nr	TEO 022_09-22	
	Mõõdistas	Marek Merilo		07.09.2022	Mõõtkava	M 1:500	
Nõuni Küla, Otepää vald Valga maakond tel.+37255590450	Kontrollis	Marek Merilo		08.09.2022	Staadium		
	Projektijuht					Leht 1	Lehti 1
	MTR nr	EEG000501					
